

社会資本総合整備計画 事後評価書（活力創出基盤整備）

平成27年10月26日

計画の名称	1 紋別港における港湾利用の効率性・安全性の向上		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成26年度 (3年間)	交付対象	紋別市
計画の目標			

・道路幅員が狭く老朽化が進行している施設の改良により、港湾利用の効率性・安全性の向上を図る。また、長寿命化計画策定により計画的な維持管理の推進を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・港町地区のうち、第1ふ頭地区臨港道路の要改良延長の整備率を88%から100%へ拡大
- ・港湾の機能を維持するため、予防保全のための維持管理計画策定率を0%から100%へ拡大

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H26末)							
港湾台帳における第1ふ頭地区臨港道路の全体延長に占める改良済み延長により算出 (改良延長整備率の割合) = (改良済み延長) / (全体延長 1,367m) (%)	88%	94%	100%							
維持管理計画策定が必要な施設数に占める策定済み施設数により算出 (策定率の割合) = (策定済み施設数) / (全体施設数 10件) (%)	0%		100%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	86 百万円	A	86 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（完了評価）

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期

事後評価(中間評価)の実施体制	事後評価(中間評価)の実施時期
紋別市建設部内で実施	事業終了後、平成27年9月
	公表の方法
	紋別市ホームページ

交付対象事業

A 港湾事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H24	H25	H26	H27	H28			
1-A-1	港湾	北海道	紋別市	直接	—	重要	改良	臨港道路の改良	延長L=175m、幅員W=12.15m	紋別港・港町地区						84		
1-A-2	港湾	北海道	紋別市	直接	—	重要	維持管理	橋梁の維持管理計画策定	延長L=11.4m、幅員W=15.8m	紋別港・港町地区						2		
小計(港湾事業)																86		
合計																	86	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
合計																	


番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 道路幅員が狭く老朽化が進行している施設を整備することにより、港湾利用の効率性・安全性が向上した。 また、維持管理計画策定により計画的な維持管理と施設の延命化が図られる。 			
II 定量的指標の達成状況	指標① 港湾台帳における第1ふ頭地区臨港道路の全体延長に占める改良済み延長の割合	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標② 維持管理計画策定が必要な施設数に占める策定済み施設数の割合	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項(今後の方針等)					

(参考図面)活力創出基盤整備

計画の名称	1 紋別港における港湾利用の効率性・安全性の向上	交付対象	紋別市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成26年度 (3年間)		

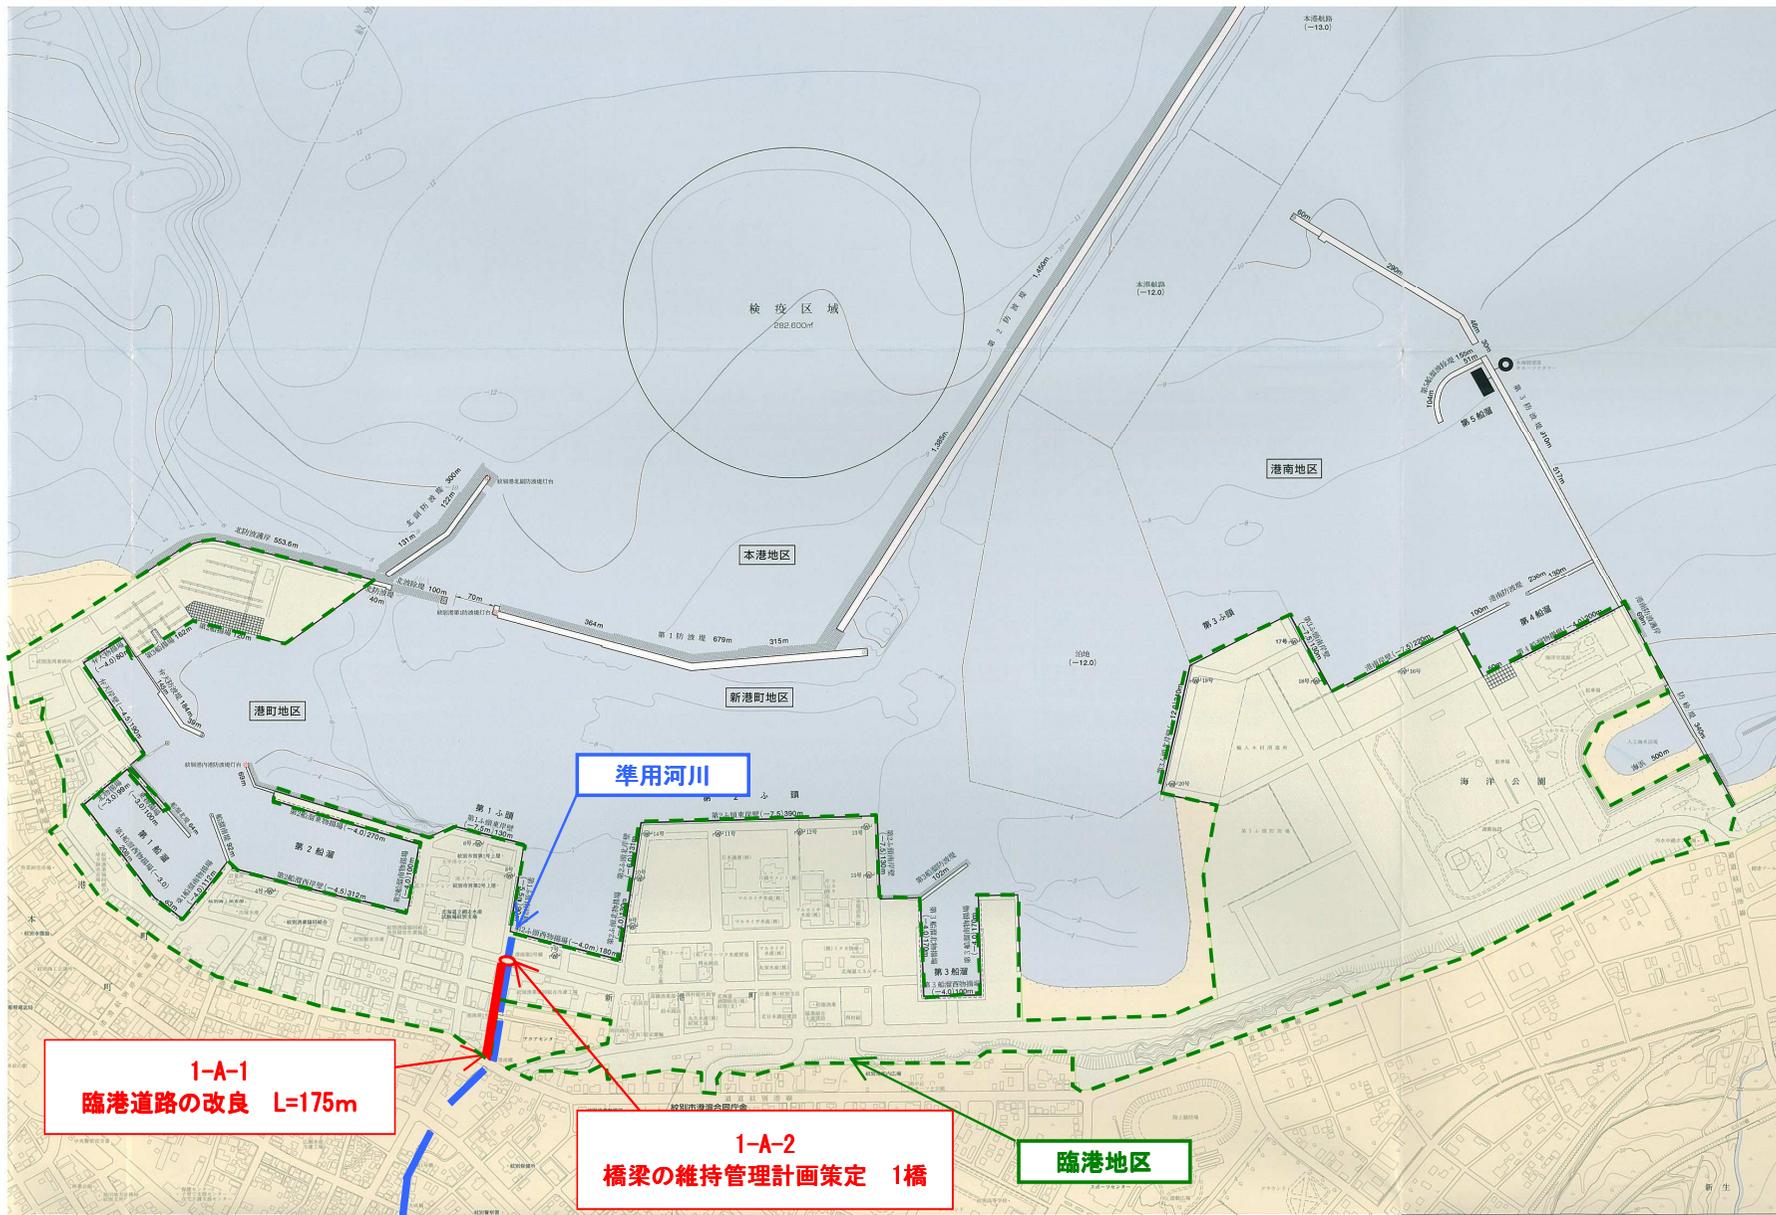

1-A-1
臨港道路の改良 L=175m

1-A-2
橋梁の維持管理計画策定 1橋

臨港地区
